Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
		2025-02-03
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	FOM303-45

FECHA:	12/08/2025	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	1565
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Dióxido de azufre
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	12/08/2025
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	20.00	20.0	0

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	185.7
2	2056
3	28.6
4	50
5	725
6	235
7	3974
8	3.3
9	11.9
10	24.1
11	5
12	5
13	1

Prueba de Fugas

Referencia	130.4	Delta	5.1
Retención	135.5		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		0%		Porcentaje Final Bomba		100%
Flujo Calibrador		0.35875				
Linearización	Set point	0	Raw	0.2032	Corregido	0.03384
		16		14.99		16

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	0.00	0.02	400.00	400.01	0.02	0.00

Punto control de calidad QC

Fecha:			
	Punto de calidad SO2 (ppb) ±40 ppb (5 a 80 ppb) (cada 14 días)	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 10.1 %
	450.0	450.20	0.0%

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	N.A	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	N.A	
K anterior	N.A	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span	N.A	
Valor de lectura (sin compensación)	N.A	
K nuevo	#¡VALOR!	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0.00	N.A	0.00	0.00	0.00
2	100	N.A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3	200	N.A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4	250	N.A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5	300	N.A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6	350	N.A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7	400	N.A	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05** 2025-02-03
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** **Diferencia ± 2.1%**
1000.0	

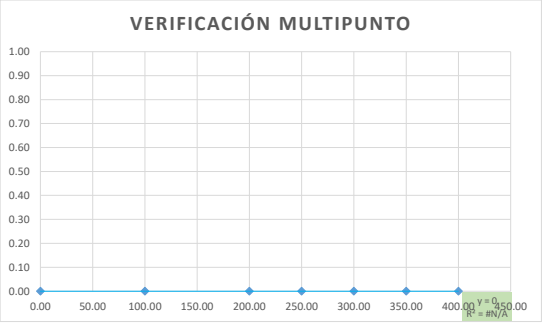

Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion punto de control y punto de precision, teniendo en cuenta el cronograma no corresponde realizar verificacion curva multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	
