Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-42
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	

FECHA:	2025-02-12	EQUIPO:	0342e	SERIAL:	1096
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.695722	CONTAMINANTE:	Ozono
ESTACIÓN:	CA2 CNA	OESTE:	-74.139528	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173
				Proximo a calibrar	16/04/2025

Configuración EPA

Escala:	0.4	Fecha instalación filtro Teflón	12/02/2025
Tiempo Automatico Respuesta:	11034	Prueba de Fugas	OK
Temperatura Operación °C (± 2)	35	Flujo lpm (± 5%)	1

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	24.00	24.0	0

Revisión Señales MUX O342

Signals	Min. values	Typical values	Max values
Reference zero filter	0	365	N. A.
UV Measure signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
UV Reference signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
LED current	2 mA	3 mA	15 mA
Internal temperature	5 °C	30 °C	45 °C
Absorption medium temperature	+ 5 °C	+ 25 °C	+ 45 °C
Flow rate	30 NL/h	55 NL/h	90 NL/h
Atmospheric pressure	300 hPa	1002 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	340 hPa	600 hPa
Absorption medium pressure	300 hPa	990 hPa	1200 hPa
+4 V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.2 V	3.3 V	3.4 V
+12 V supply	11.8 V	12 V	12.2 V
+24 V supply	23,4 V	24,0 V	25.0 V
+5 V supply	4.8 V	5 V	5.2 V
Sensor +5 V supply	4.9 V	5 V	5.1 V
+24V current	- 0.1 A	0,5 A à 3 A	> 6 A
GND	-1 mV	0 mV	+1 mV
GNDA	-1 mV	0 mV	+1 mV

Canal	Valor
1	340
2	347.8
3	1369.6
4	33
5	25.1
6	28
7	62
8	744
9	373
10	1030
11	4035
12	3.3
13	11.9
14	24
15	5
16	5
17	0.9
18	0
19	0

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	2.46
Zero Nuevo	0.07
K anterior	1.0500
Valor de gas Span	400
Valor de lectura (sin compensación)	398
K nuevo	1.0553

$$Autoajuste\ del\ zero$$

$$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{Valor\ de\ la\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$$

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAM	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)	Spam (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ±7.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
					0.00	#¡DIV/0!

Punto de Precisión

Punto de Precisión 03 (ppb) 90% CL CV < 7.1%	Medición Equipo (ppb)
450.0	

Pendiente e intercepto ecuación de calibración fotometro

M (ecuación de calibración)	B (ecuación de calibración)
0.994	5.67

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Referencia Corregido	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0	0.07	0.00	0.00	0.00
2	100	94.89939638	98.00	97.28	0.72	0.76%
3	200	195.5030181	200.10	198.70	1.39	0.71%
4	250	245.804829	250.00	249.41	0.59	0.24%

5	300	296.1066398	300.30	300.11	0.18	0.06%
6	350	346.4084507	351.00	350.82	0.17	0.05%
7	400	396.7102616	400.00	401.53	1.53	0.38%

Arplus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02 **FOM303-42**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	

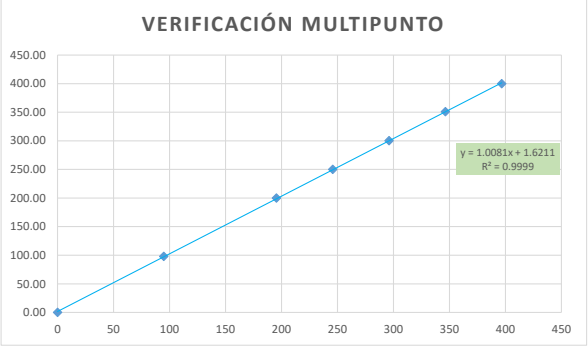

Observaciones:

No presenta novedades el equipo

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz
