Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2024-09-02 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	30/08/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	2313
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	30/08/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	23.9
2	2.1
3	32
4	727.2
5	122
6	137
7	1.2
8	613
9	29.3
10	60
11	0.015
12	340
13	64.25

Prueba de Fugas

Referencia	135.02	Delta	0
Retención	135.02		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	34.01	Porcentaje Final Equipo	33
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)	Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	NA	918.0	NA

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.24	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	0.24	
K anterior	0.85897	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin offset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	801.80	
K nuevo	0.85704	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.24	0.00	0.00	0.00
2	250	250.40	250.46	0.06	0.02%
3	350	349.40	350.00	0.60	0.17%
4	499	499.70	499.45	0.25	0.05%
5	600	599.70	599.99	0.29	0.05%
6	701	701.40	700.72	0.68	0.10%
7	800	800.00	800.26	0.26	0.03%

Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	1.10	0.00	0.00	0.00
2	255	258.40	257.26	1.14	0.44%
3	357	356.70	358.77	2.07	0.58%
4	509	507.80	511.20	3.40	0.66%
5	612	625.50	613.73	11.77	1.92%
6	715	711.70	716.47	4.77	0.67%
7	816	816.00	817.98	1.98	0.24%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
60.49	250.7	190	190	189.59	0.61	0.32%
86.77	350	263	263	262.70	0.60	0.23%
121.40	497	378	376	377.30	1.70	0.45%
148.50	598.1	451	450	450.59	0.99	0.22%
178.30	700.3	522	522	521.38	0.62	0.12%
204.80	799.9	595	595	594.27	0.83	0.14%

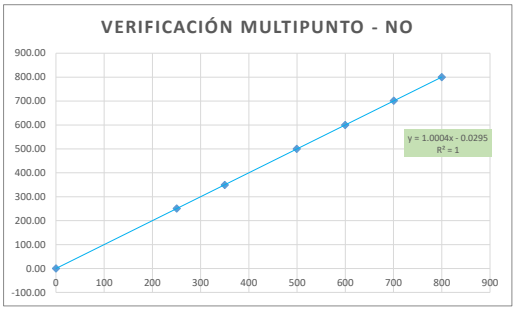

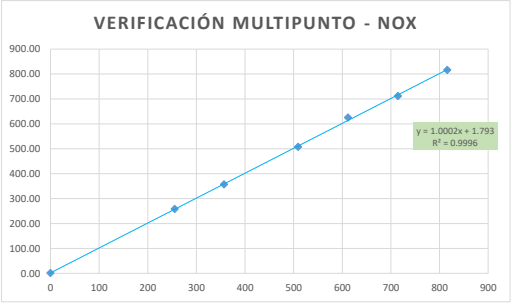

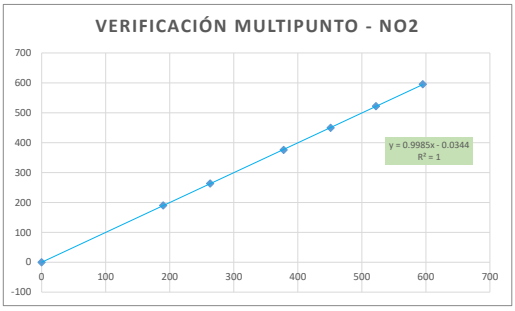

Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.24	1.1	0	0	0.24	-0.86	---
250.4	258.4	60.49	250.7	189.91	182.21	95.95%
349.4	356.7	86.77	350	262.63	255.93	97.45%
499.7	507.8	121.4	497	378.30	367.50	97.15%
599.7	625.5	148.5	598.1	451.20	423.80	93.93%
701.4	711.7	178.3	700.3	523.10	511.70	97.82%
800	816	204.8	799.9	595.20	579.10	97.30%

Coeficiente Correlación	99.9570%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades, Se realizar verificacion curva de calibracion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz
